



令和2年7月豪雨による堤防への影響を確認するため、令和2年9月～11月に寄藻川・松崎川・駅館川・伊呂波川における河川堤防の緊急点検を行いました。

河川堤防緊急点検の結果、措置段階箇所(※1)3箇所、予防保全段階箇所(※2)45箇所を確認しました。内訳は以下のとおりです。

※1 措置段階箇所とは、現段階で支障があり、補修等の対策が必要な箇所

※2 予防保全段階箇所とは、現段階で支障はないが、今後対策が必要な箇所

点検河川	点検した 河川延長  km	措置段階箇所					予防保全段階箇所				
		樹木の侵入	侵食(ガリ)	護岸破損	特殊堤の破損 (コンクリート壁)	計	樹木の侵入	侵食(ガリ)	護岸の破損	特殊堤の破損 (コンクリート壁)	計
		(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)	(箇所)
寄藻川	8.1					0	11	1	6	1	19
松崎川	2.2			1		1	1		3		4
駅館川	10.3					0	5		13	2	20
伊呂波川	9.1			2		2	2				2
合計	29.7	0	0	3	0	3	19	1	22	3	45

措置段階箇所については、既に対策に着手しています。また、予防保全段階箇所については、順次、補修等の対策を行っていきます。





## ○措置段階箇所への対応状況


・松崎川 護岸破損箇所：護岸破損箇所の復旧工事に向け、現在、測量設計・地質調査を実施中



護岸背後陥没



パイピングの状況。ポール先端(2箇所)

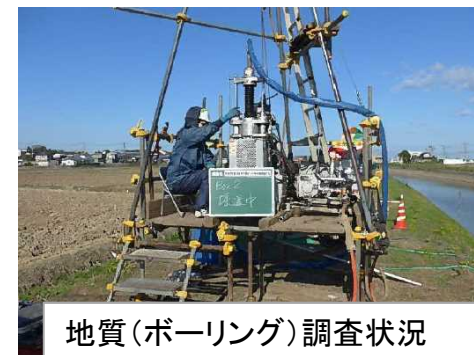

地質(ボーリング)調査状況

・伊呂波川 護岸破損箇所：11月に護岸破損箇所の復旧工事契約済み



堤防張ブロックの破損(遠景)



堤防張ブロックの破損(遠景)



堤防張ブロックの破損(近景)

## ○予防保全段階箇所への対応状況

- ・駅館川のコンクリート壁のずれについては、11月に補修済み
- ・他箇所も、順次対応予定



補修前



補修後
