


稲葉ダムだより

発行:稲葉ダム安全衛生連絡協議会
事務局 鹿島・大林・さとうJV 稲葉ダム本体建設工事事務所
竹田市大字下坂田830
TEL 0974-66-3939 FAX 0974-66-3940

寒さ厳しき折、稲葉ダム近隣地区の皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。平素はダム建設工事に格段のご理解とご協力を頂き有難うございます。当工事におきましては、本体工事、貯水池対策工事の1工区、2工区、3工区、4工区、5工区の工事を先月に引き続き進めて行きます。日ごとに寒さが増してまいります。寒風に身の縮むような毎日、健やかに過ごして下さいますよう祈念いたします。

* 現場見学をご希望の際は、当企業体もしくは竹田ダム建設事務所まで、お気軽にご連絡下さい。

トピックス

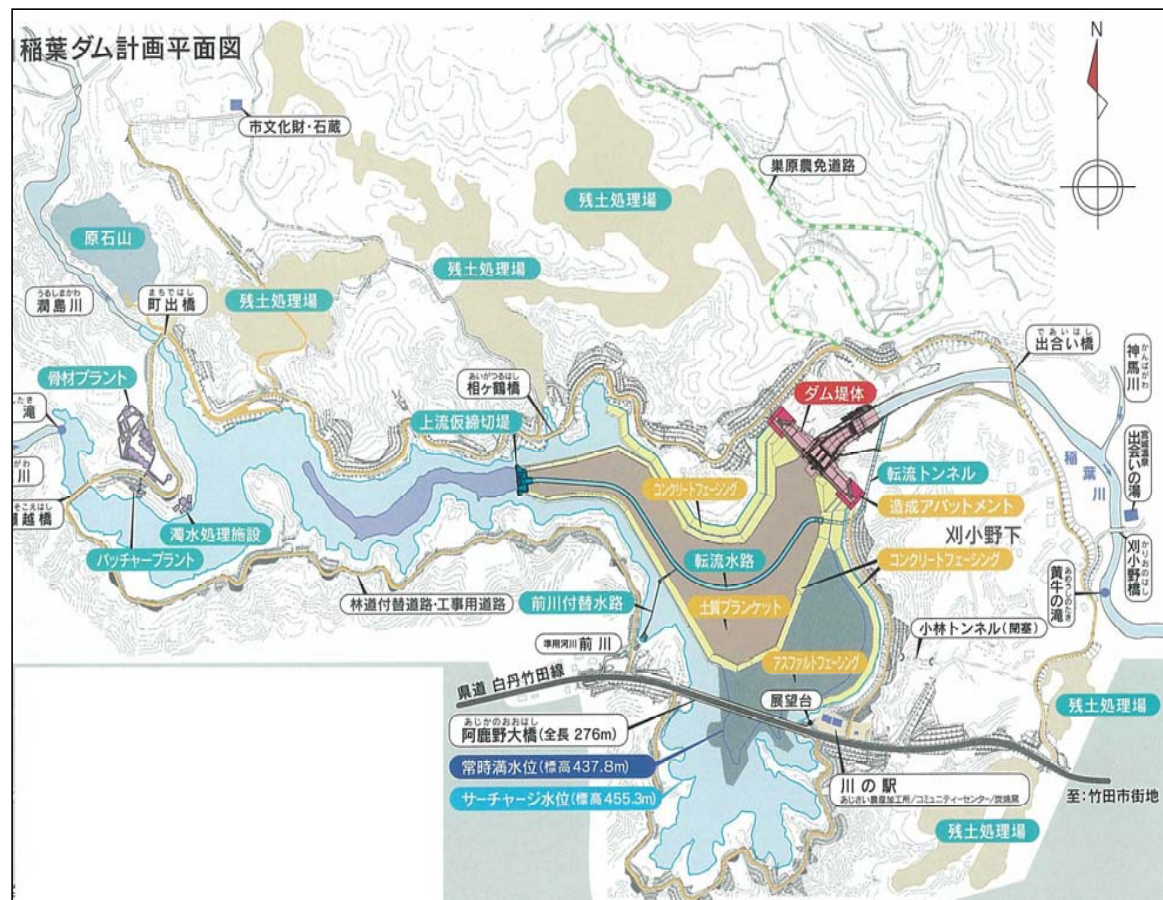

貯水池対策工事では、現在アスファルトフェーシング及び土質ブランケットを行っています。貯水池部分に水が浸透しやすい地質が広範囲に分布する為、コア材・アスファルト材によって被覆する工法です。さらにその表面を現場発生土によって保護します。施工範囲は上記図面で土質ブランケット及びアスファルトフェーシングと表記されている箇所になります。

現場のようす

本体付近工事



稲葉ダム本体工事
撮影日:平成19年12月13日

貯水池対策工事 左岸側工事 (4工区、5工区)



貯水池対策工事
撮影日:平成19年12月13日

土質ブランケット施工状況



貯水池対策工事
撮影日:平成19年12月13日

右岸側工事 (2工区、3工区)



貯水池対策工事
撮影日:平成19年12月13日

土質ブランケット施工状況



貯水池対策工事
撮影日:平成19年12月13日
